

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA

ID da proposta	Processo	Atividade / Procedimento
PR/2025/7166	10443/2025	Proposta à Câmara Municipal
Unidade Administrativa		
DOM - DGE [ENTRADAS]		
Propósito		
Órgãos Colegiais \ Deliberação Câmara Municipal		
Órgão/Cargo que resolve		
Câmara Municipal de Braga		

FACTOS E FUNDAMENTOS LEGAIS

Ordenamento e regularização do rio Torto e Ribeira de Panoias - 2ª Prorrogação de prazo

Propõe-se a aprovação da prorrogação de prazo da empreitada por um período de 120 dias, prevendo-se a conclusão da empreitada até 07/06/2025, conforme informação técnica da gestora do contrato.

Sendo que os motivos da prorrogação de prazo são da responsabilidade do dono de obra, o empreiteiro terá direito à reposição do equilíbrio financeiro do contrato.

Tendo em conta que o plano de trabalhos apresentado com o pedido de prorrogação de prazo é referente a um prazo de 150 dias, deve a entidade executante apresentar um novo plano de trabalhos ajustado ao prazo a conceder - 120 dias.

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

À Reunião de Câmara para deliberação nos termos das condições estipuladas na informação técnica de suporte à presente decisão.

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE



Data: 05/03/2025

Nº Processo: 1886/2024

Processo: Gestão de empreitadas - (2023/300.10.001/141) - Ordenamento e regularização do rio Torto e Ribeira de Panoias

Remete-se informação técnica com resposta ao pedido de prorrogação de prazo referente à empreitada em assunto.

Utilizador: Paula Cristina Monteiro Alvares Pereira



INFORMAÇÃO – 2ª PRORROGAÇÃO PRAZO EMPREITADA

Processo Obra: 2023/300.10.001/141

Requerente: Alexandre Barbosa Borges, SA

EMPREITADA: Ordenamento e Regularização do Rio Torto e Ribeira de Panoias

Registo de entrada do pedido: 2025-E-RC-4181 de 10/02/2025

Assunto: Análise de pedido de prorrogação de prazo da empreitada (2º pedido)

Valor do contrato Inicial: 2.295.133,71€

Órgão competente: Câmara Municipal

Data Consignação: 15/12/2023

Data Aprovação P.S.S.: 15/12/2023

Prazo Inicial: 240 dias

1ª prorrogação de prazo: 120 dias (conclusão em 09-12-2024)

MOC 2 – 60 dias de prazo (conclusão 07-02-2025)

Data prevista para a conclusão dos trabalhos: 07/02/2025

Técnico responsável: Paula Cristina Monteiro Alvares Pereira

PEDIDO APRESENTADO:

A entidade executante da empreitada “**Ordenamento e Regularização do Rio Torto e Ribeira de Panoias**” apresentou um pedido de **prorrogação de prazo** motivado pelo seguinte:

- a) *indefinições/incompatibilidades de projeto e falta de autorização para realização de trabalhos que impossibilitaram a execução de trabalhos nos troços 2 e 3.*
- b) *Condições atmosféricas manifestamente adversas registadas.*

Assim, a **Entidade Executante (EE)** veio requerer a prorrogação do prazo por mais **150 dias** (até 07-07-2025)

ANÁLISE:

- a) Confirmando a impossibilidade até 10 de fevereiro de 2025 de executar a passagem hidráulica (PH) sob a EN205 e a necessidade de realizar trabalhos para a estabilização do talude entre os perfis 2.1 e 2.2, sem isto não possível o acesso à zona do moinho, perfil 2.4.

Estes últimos são trabalhos complementares que carecem ainda da formalização através de uma proposta aprovação numa 2ª modificação objetiva ao contrato da empreitada (MOC 2).

Só depois desta formalidade há condições para entrar neste troço, junto ao perfil 2.1.

Para a produção da box culvert são necessários aproximadamente 30 dias. Para a sua colocação e construção de muros marginais são necessários mais cerca de 45 dias. Entretanto há que desviar as infraestruturas da AGERE e d Portgás. As de telecomunicações terão de ficar suspensas durante a execução da obra (haverá um custo para as manter suspensas e em segurança), trabalhos não contemplados na empreitada, tendo no projeto a autora do mesmo remetido estes trabalhos para as entidades gestoras, que conforme reuniões tidas no local com as mesmas, não estão disponíveis para suportar esses custos.

Para a execução do troço 2 desde o perfil 2.1 até à EN 205-4, mais propriamente para a execução dos dois açudes, está previsto na programação da obra, aproximadamente 30 dias.

Depois dos açudes construídos é necessário fazer a estabilização de margens, a execução do percurso pedonal, colocação do mobiliário urbano e fazer as plantações, estas ultimas não devem ser feitas depois do final do mês de maio.

Parece-me, portanto, conceder a prorrogação do prazo por 120 dias e não os 150 dias solicitados, o que implica que a obra terá **impreterivelmente de ser concluída na totalidade até 07 de junho de 2025.**

Saliento que quanto refiro impreterivelmente e na totalidade fica implícito que a restante área de obra que nesta data entendo que deveria já estar concluída tem, entretanto, de ser fechada.

b) As condições atmosféricas não me parece serem o motivo principal da necessidade da prorrogação do prazo.

A obra decorreu maioritariamente em tempo de inverno e o facto de se tratar de zona ribeirinha, com solos aluvionares que rapidamente atingem o ponto de saturação e depois demoram a secar não facilita o desenvolvimento dos trabalhos nas margens, especialmente de execução de percursos de plantações.

PROPOSTA DE DECISÃO:

Assim sendo, proponho que seja **deferida** a prorrogação de prazo, mas apenas com a duração de **120 dias**, prevendo-se assim a conclusão dos trabalhos até 07/06/2025, **com direito à reposição do equilíbrio financeiro**, sem lugar aplicação de sanções pecuniárias, de forma a que estas não constituam uma dificuldade adicional ao objetivo primordial – a obtenção do resultado contratual.

Deverá ainda a Entidade Executante submeter à nossa apreciação um novo Plano de Trabalhos e respetivo cronograma devidamente ajustados ao prazo de prorrogação que lhe possa ser concedido.

À consideração superior.

O Gestor do Contrato / Fiscalização,



Exmos. Senhores,
Município de Braga
Praça do Município
4704-514 Braga

Registada C/AR

Assunto:	N.º Ref.º	V.º Ref.º:	Data:
Pedido de Prorrogação de Prazo	GT0049/2025	N.A.	07/02/2025
Empreitada "ORDENAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO RIO TORTO E RIBEIRA DE PANÓIAS"			

Exmos. Senhores,
Os nossos cumprimentos,

Conforme é do conhecimento de V.ªs Ex.ªs o prazo de execução da empreitada referida em assunto tem o seu término previsto para 07/02/2025, sendo que, não obstante a Entidade Executante ("EE") se encontrar totalmente empenhada em colaborar com V.ªs Ex.ªs e em executar o contrato, dadas as concretas vicissitudes enfrentadas e as reais condições de execução das prestações de seu objeto, tornou-se impossível o cumprimento do prazo inicialmente estabelecido.

Dito isto, a presente exposição pretende trazer à consideração de V.ªs Ex.ªs os motivos, de facto e de direito, já amplamente debatidos e conhecidos pelas partes, que legitimam a necessidade de prorrogação do prazo da empreitada até, pelo menos, **07 de julho de 2025**, garantindo o término dos trabalhos objeto do contrato, com o rigor e qualidade que se exige, no mais curto espaço de tempo possível.

A Memória Descritiva e Justificativa em anexo pretende trazer à consideração do Dono da Obra ("DO") os motivos, de facto e de direito, já amplamente debatidos e conhecidos pelas partes, que legitimam o direito da EE a ver prorrogado o prazo da empreitada.

A título telegráfico, desde já se adianta que o pedido de prorrogação formulado assenta em 2 (dois) pilares essenciais que se encontram melhor explicitados na Memória Descritiva em anexo, a saber:

- A - Indefinições/incompatibilidades de projeto e falta de autorização para a realização de trabalhos que impossibilitam a execução de trabalhos nos Troços 2 e 3;
- B - Condições atmosféricas manifestamente adversas registadas.

Página 1 de 2

SEDE | ESCRITÓRIO

RUA DO LABRÍOSQUE, N.º 70
4755-307 MARTIM, BARCELOS
T. +351 253 142 000
F. +351 253 142 001

WWW.ABBORGES.PT
GERAL@ABBORGES.PT

ALVARÁ DE CONST. N.º 10408 - PUB



Âmbito: Conceção, desenvolvimento e c
públicas, construção civil e obras em c
desenvolvimento e produção de betão pronto e
Receção e valorização de resíduos de construção e demolição.



Ora, as situações elencadas *supra* (e melhor explicitadas na Memória Descritiva e Justificativa em anexo) e a cadência com que as mesmas foram sendo recebidas no contrato tiveram um grande impacto no planeamento contratual e na impossibilidade absoluta e objetiva do seu cumprimento, vendo-se, desta forma, a EE impedida de implementar desenvolver os trabalhos de forma sequencial, conforme expectativa e previsão inicial no plano de trabalhos, tudo com gritantes perdas de rendimento e impacto nefasto no prazo da empreitada.

Isto posto, e por tudo o quanto fica dito, serve a presente para solicitar a V.ªs Ex.ªs a prorrogação do prazo de execução da empreitada até **07 de julho de 2025**, remetendo-se, para o efeito e em anexo, a Memória Descritiva e Justificativa da prorrogação e o Plano de Trabalho Ajustado a esta última data, tudo com as legais consequências e no pressuposto, claro está, da resolução dos pendentes, da melhoria das condições climáticas verificadas e do estado de saturação dos solos que permita a execução dos trabalhos.

Nesta conformidade, estamos convictos de que V.ªs Ex.ªs terão a proficiência de conceder a solicitada prorrogação do prazo até **07 de julho de 2025** nos exatos moldes solicitados pela EE por ser a única decisão que, para além de justa e devida, acautela o interesse público e permite a execução do contrato no mais curto espaço de tempo possível.

De igual modo, por questões de abertura e lealdade (valores que sempre orientaram as partes na sua relação contratual) não podemos deixar de referir que, as perturbações introduzidas no planeamento contratual, a impossibilidade de cumprimento do prazo e a sua necessária prorrogação tem um fortíssimo impacto na equação financeira inicial, com a assunção de elevadíssimos sobrecustos pela EE, pelo que, nos termos do disposto nos artigos 282.º e 354.º, do CCP, desde já se requer a reposição do equilíbrio financeiro do contrato, não sendo, contudo, os custos, sobrecustos e prejuízos passíveis de serem aferidos nesta data, mas assim que o sejam, serão encaminhados para V.ªs Ex.ªs.

Reforçamos a necessidade de ser imprimidos os melhores esforços na resolução das situações ainda pendentes, por forma a não comprometermos, ainda mais, o prazo de execução da empreitada.

Convictos de que V.ªs Ex.ªs concordarão com o exposto, subscrevemo-nos com elevada estima e consideração,

A Administração,



MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO



ORDENAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO RIO TORTO E RIBEIRA DE PANÓIAS

MUNICÍPIO DE BRAGA



Índice

1. Introdução	4
2. Descrição Geral da Empreitada	4
2.1 Descrição da empreitada	4
3. Planeamento e Prazo da Obra.....	5
3.1 Justificativo do Pedido de Prorrogação	5
3.2 Condicionalismos e Implicações	5
4. Conclusão	7



Índice de figuras

Figura 1 - Delimitação das Zonas Suspensas por causa da Arqueologia **Erro! Marcador não definido.**

Figura 2 – Exemplos de localização das sondagens arqueológicas **Erro! Marcador não definido.**



1. Introdução

Pretende-se com a presente Memória Descritiva e Justificativa trazer à consideração do Dono da Obra ("DO"), de um modo claro, o novo plano de trabalhos da **"Ordenamento e Regularização do Rio Torto e Ribeira de Panóias"** evidenciando alguns dos principais constrangimentos que não permitiram o cumprimento do plano de trabalhos em vigor e que, nessa medida, justificam a apresentação de uma nova data de conclusão dos trabalhos, de forma a garantir a qualidade dos mesmos e o cumprimento de todas as especificações do projeto e sobretudo a garantindo a sua total funcionalidade.

Dito de outra forma, os pressupostos nos quais assentou a elaboração do primeiro plano de trabalhos sofreram interferências que fogem da esfera de controlo da Entidade Executante ("EE") obrigando ao seu reajustamento para fazer face aos constrangimentos e situações verificadas em fase de preparação e execução de obra, sem perder de vista os padrões de qualidade estabelecidos, o respeito total por todos os intervenientes, pelo meio ambiente envolvente, o controlo final dos custos e, ainda, a observância estrita das medidas consignadas no Plano de Segurança Higiene e Saúde.

2. Descrição Geral da Empreitada

2.1 Descrição da empreitada

Segundo a Memória Descritiva de projeto a presente empreitada compreende *"uma proposta de Ordenamento e Regularização do Rio Torto e da Ribeira de Panóias como forma de minimização das cheias que atualmente ocorrem na bacia hidrográfica da Ribeira de Panóias (...). Para reduzir as pontas de cheia (...) entre as várias medidas (...) incluem-se bacias de retenção, bem como medidas passivas (...), nomeadamente regulamentação da ocupação do solo e preservação da rede hidrográfica e seus corredores ribeirinhos."*

Os trabalhos a executar inserem-se no sistema ribeirinho da Ribeira de Panóias e estão divididos em dois troços de acordo com os seus dois principais afluentes Rio Torto (Troço 3) e Ribeira de Castro (Troço 2).

O Troço 2 tem extensão de 1764 m, compreendida entre a Avenida do Estádio e a Rua de São Martinho, correspondendo à Ribeira de Castro e o Troço 3 referente a parte do traçado do Rio Torto, será intervencionado numa extensão aproximada de 300m entre a rotunda da ETAR de Frossos (Rua Quinta do Carreiro) até a EN 201.

No âmbito da empreitada serão executados os seguintes trabalhos:

- Desmatização das áreas de intervenção;
- Demolição de elementos existentes que interferem com o projeto;
- Desvio de serviços afetados;
- Movimentação de terras para modelação dos terrenos;
- Reperfilamento da linha de água;
- Execução de técnicas de bioengenharia para recuperação e estabilização das margens e taludes;
- Consolidação de margens e leito do rio, com reforço da galeria ripícola e das condições de acessibilidade às margens;



- Execução de muros marginais em alvenaria de pedra;
- Beneficiação das ligações entre margens com a introdução de passagens/passadiços;
- Execução de açudes em betão armado e cantarias de granito
- Execução de áreas de lazer;
- Fornecimento e colocação de iluminação e mobiliário urbano;
- Plantações e sementeiras.

3. Planeamento e Prazo da Obra

3.1 Justificativo do Pedido de Prorrogação

Ora, o presente projeto é um projeto dinâmico, aberto às necessárias adaptações que as condicionantes “naturais” e reais (encontradas in situ) obrigam a introduzir no mesmo. Isto é, ao longo da sua execução sempre são analisadas alterações e melhorias a introduzir no projeto de execução, resultantes das dúvidas que vão surgindo, das condicionantes naturais e da própria adaptação do mesmo à realidade encontrada em obra.

No caso concreto, foram várias as condicionantes e condicionalismos enfrentados e que, pura e simplesmente, impossibilitaram a implementação do planeamento inicial.

3.2 Condicionalismos e Implicações

Com especial relevo para a presente, destacamos o facto de que, antes mesmo do efetivo início dos trabalhos da empreitada (em fase de preparação) a EE detetou inúmeras indefinições no projeto e, também, problemas de compatibilizações entre os projetos das várias especialidades e o existente nas áreas de intervenção.

Por forma a trazer essas situações ao conhecimento do DO foram elaborados inúmeros Pedidos de Esclarecimentos (“PE”), a título de exemplo:

- Relativamente ao troço 3, após as inundações ocorridas no mês de setembro de 2024, só podemos recomençar os trabalhos cerca de 60 dias depois, ou seja, no mês de novembro de 2024.
- Relativamente ao troço 2, a EE aguarda esclarecimento/resolução sobre os seguintes temas:
 - entre o Perfil 2.1 e Perfil 2.4 (Moinho):
 - À data da presente memória, ainda não existe decisão sobre a estabilização do talude existente entre o Perfil P2.1 e P2.2). Até cabal e completa resolução deste assunto, a zona de trabalhos compreendida entre o início do troço 2 (Av. Dra. Assunção Vasconcelos Chaves) até ao Moinho, é uma zona na qual a EE não pode e/ou está impossibilitada de executar trabalhos – ver zona referenciada na figura 1.
 - e entre o Perfil P2.4 e o P2.19 (incluindo a EN205-4):



- desde do início da empreitada, que não existe autorização para realização trabalhos nesta zona da empreitada por indefinições de projeto e/ou autorização da entidade gestora da EN205-4. – ver zona referenciada na figura 1.
- entre o Perfil 2.50 e R. São martinho:
 - apenas no início de janeiro de 2025, foi dada ordem para a realização de trabalhos entre o P2.50 e a estrada de S. Martinho. – ver zona referenciada na figura 1.
- Para além das situações referidas *supra*, outra grande condicionante à implementação do Plano de Trabalhos em vigor prende-se com o facto de que, desde do início da empreitada, a zona de intervenção tem sido gravemente afetada com condições atmosféricas evidente e manifestamente adversas que, como é do conhecimento do DO, para além de causar grandes danos nos trabalhos já executados (exemplo, registo via e-mail dado de 27 de setembro de 2024), impediram a execução de trabalhos, impediram mesmo a própria circulação de equipamentos na zona devido à anormal saturação dos solos (que se mantinha mesmo nos dias em que não chovia) impedindo, assim, a execução de quaisquer tarefas do plano de trabalhos relacionadas com (i) movimentação de terras, (ii) modelação dos taludes, (iii) abertura de caixa para percurso pedonal, (iv) trabalhos no leito do rio para a realização dos vários tipos de açudes e passadiços, (v) entre muitos outros já enumerados em momento anterior.

Ora, o facto de, após dias seguidos de chuva, haver um período de dias sem chuva não foi, ainda assim, suscetível de permitir a execução dos trabalhos pela EE, pois que, para além de os solos apresentarem um anormal nível de saturação, os trabalhos desenvolvem-se na proximidade (e no próprio) leito do rio.

Ou seja, para além de ter de se aguardar pela baixa do nível da água do rio, tem de se aguardar um período adicional para que baixe a saturação dos solos e se consiga circular com os equipamentos em condições de segurança.

De igual modo, atenta a especial dificuldade/complexidade dos acessos às frentes de trabalhos, sempre que haja necessidade de reajuste da frente de trabalho disponível em consequência das indefinições e/ou problemas, torna-se necessário, previamente, efetuar uma análise/avaliação sobre a efetiva possibilidade de avançar para uma frente distinta, pois que, a execução dos trabalhos da empreitada têm de obedecer a uma lógica sequencial e contínua para não fazer derrapar (ainda mais) os custos associados a essa execução.

De resto, se em condições normais já estaríamos perante uma tarefa hercúlea, atentas as indefinições e problemas registados na empreitada, planejar e assegurar, de forma correta, completa e adequada, os aprovisionamentos de materiais e subempreitadas para a realização da empreitada tornou-se uma tarefa quase impossível, situação que, do mesmo modo, também tem impacto no plano de trabalhos e na impossibilidade do seu cumprimento.





Figura 1 - Zona da intervenção da empreitada com indefinições

4. Conclusão

Pelo exposto, para que seja possível à EE executar os trabalhos e concluir a empreitada com o rigor e qualidade que se exigem, afigura-se necessária uma prorrogação do prazo de execução da empreitada por um período de mais 150 dias, acarretando que a data final seja transportada para o dia 07/07/2025, isto, claro está, no pressuposto que:

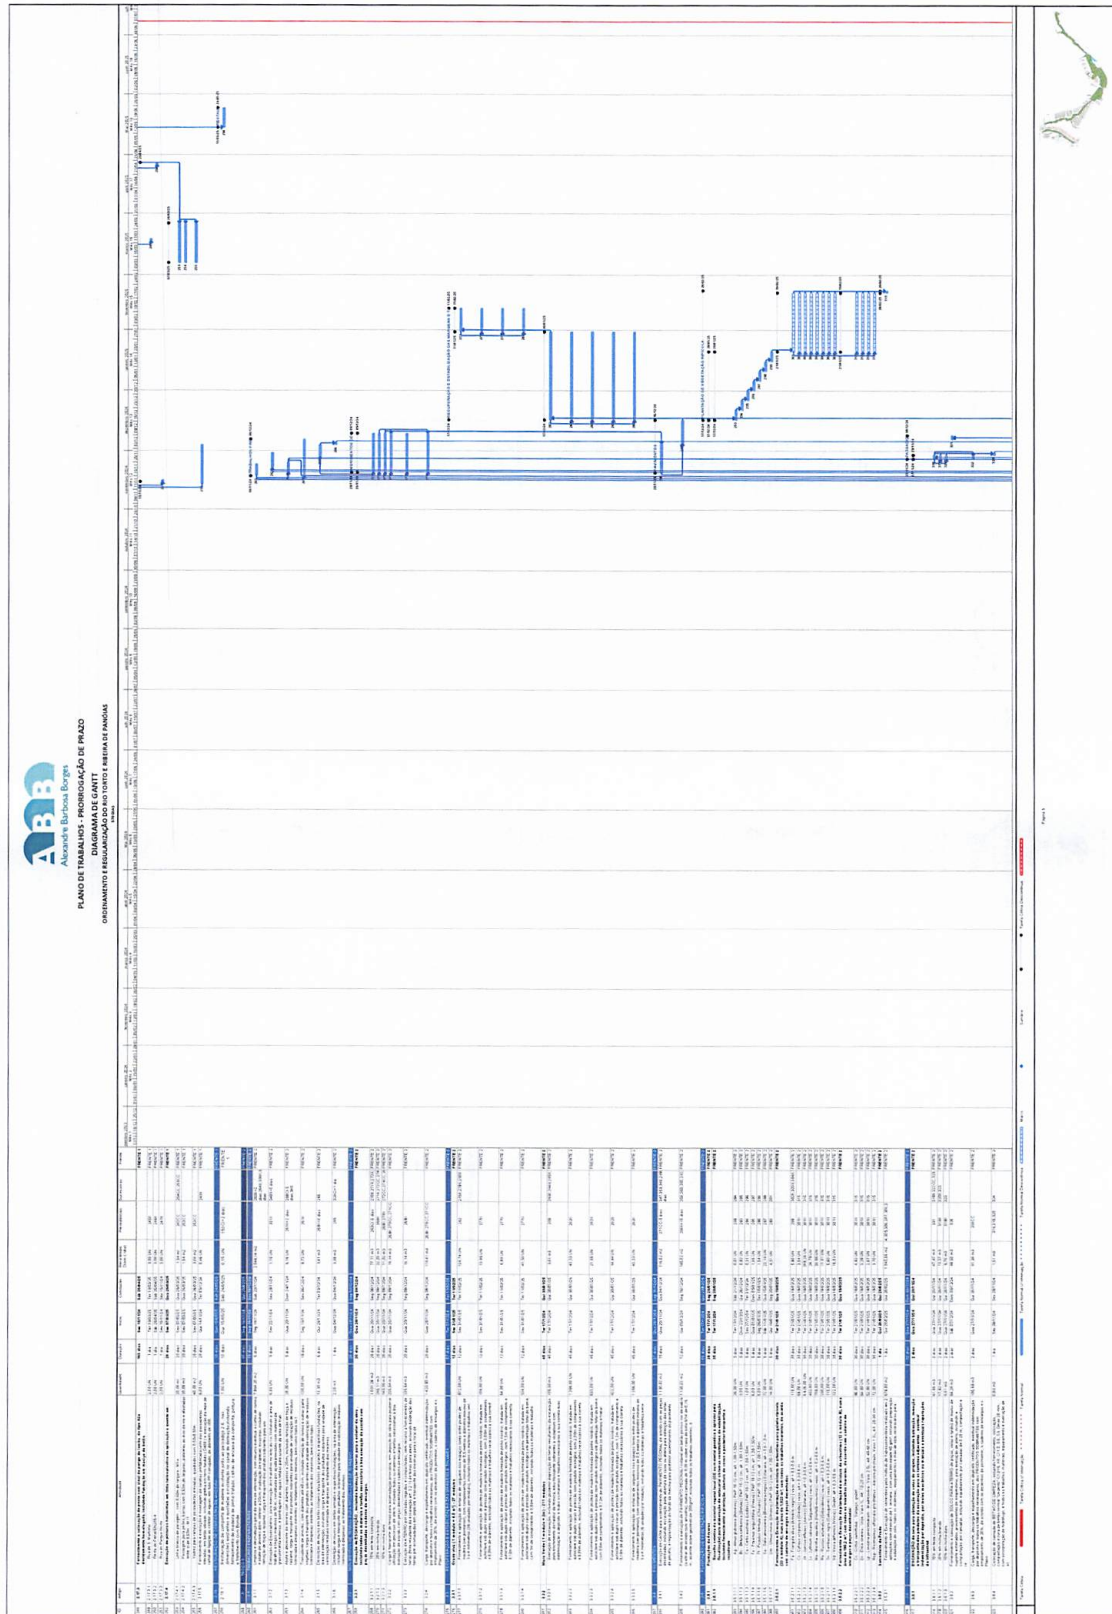
- os assuntos pendentes (relativos ao Troço 2) sejam ultrapassados/resolvidos até ao dia 28 de fevereiro de 2025, sendo que após essa resolução são necessários 30 dias para aprovisionamento de material por forma a iniciarmos a execução das tarefas.
- Haja condições climáticas favoráveis à realização das tarefas em falta executar no âmbito da empreitada.

Em suma, caso estes pressupostos não sejam cumpridos, o presente pedido de prorrogação ficar, também ele, comprometido.










1000



[illegible]

Page 1

Código Validação: A2GZMA2QZXE6G8WZGZDHHN4588NA
Verificação: <https://braga.balcaceletronico.pt/>
Documento assinado eletronicamente na plataforma eSP





ORDENAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO RIO TORO E BARRAGEM DE PANDIAS

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	







[illegible]



Tabela 1		Tabela 2		Tabela 3		Tabela 4		Tabela 5		Tabela 6		Tabela 7		Tabela 8		Tabela 9		Tabela 10		Tabela 11		Tabela 12		Tabela 13		Tabela 14		Tabela 15		Tabela 16		Tabela 17		Tabela 18		Tabela 19		Tabela 20		Tabela 21		Tabela 22		Tabela 23		Tabela 24		Tabela 25		Tabela 26		Tabela 27		Tabela 28		Tabela 29		Tabela 30		Tabela 31		Tabela 32		Tabela 33		Tabela 34		Tabela 35		Tabela 36		Tabela 37		Tabela 38		Tabela 39		Tabela 40		Tabela 41		Tabela 42		Tabela 43		Tabela 44		Tabela 45		Tabela 46		Tabela 47		Tabela 48		Tabela 49		Tabela 50		Tabela 51		Tabela 52		Tabela 53		Tabela 54		Tabela 55		Tabela 56		Tabela 57		Tabela 58		Tabela 59		Tabela 60		Tabela 61		Tabela 62		Tabela 63		Tabela 64		Tabela 65		Tabela 66		Tabela 67		Tabela 68		Tabela 69		Tabela 70		Tabela 71		Tabela 72		Tabela 73		Tabela 74		Tabela 75		Tabela 76		Tabela 77		Tabela 78		Tabela 79		Tabela 80		Tabela 81		Tabela 82		Tabela 83		Tabela 84		Tabela 85		Tabela 86		Tabela 87		Tabela 88		Tabela 89		Tabela 90		Tabela 91		Tabela 92		Tabela 93		Tabela 94		Tabela 95		Tabela 96		Tabela 97		Tabela 98		Tabela 99		Tabela 100		Tabela 101		Tabela 102		Tabela 103		Tabela 104		Tabela 105		Tabela 106		Tabela 107		Tabela 108		Tabela 109		Tabela 110		Tabela 111		Tabela 112		Tabela 113		Tabela 114		Tabela 115		Tabela 116		Tabela 117		Tabela 118		Tabela 119		Tabela 120		Tabela 121		Tabela 122		Tabela 123		Tabela 124		Tabela 125		Tabela 126		Tabela 127		Tabela 128		Tabela 129		Tabela 130		Tabela 131		Tabela 132		Tabela 133		Tabela 134		Tabela 135		Tabela 136		Tabela 137		Tabela 138		Tabela 139		Tabela 140		Tabela 141		Tabela 142		Tabela 143		Tabela 144
----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------


Page 111






ABB
Associação Brasileira de Bancos
Plano de Gestão de Recursos Humanos e de Pessoal
ORÇAMENTO E PRELIMINAR DO TERCIO ANUAL E ANUAIS

ANO 2019		ANO 2020		ANO 2021		ANO 2022		ANO 2023		ANO 2024		ANO 2025		ANO 2026		ANO 2027		ANO 2028		ANO 2029		ANO 2030		ANO 2031		ANO 2032		ANO 2033		ANO 2034		ANO 2035		ANO 2036		ANO 2037		ANO 2038		ANO 2039		ANO 2040		ANO 2041		ANO 2042		ANO 2043		ANO 2044		ANO 2045		ANO 2046		ANO 2047		ANO 2048		ANO 2049		ANO 2050		ANO 2051		ANO 2052		ANO 2053		ANO 2054		ANO 2055		ANO 2056		ANO 2057		ANO 2058		ANO 2059		ANO 2060		ANO 2061		ANO 2062		ANO 2063		ANO 2064		ANO 2065		ANO 2066		ANO 2067		ANO 2068		ANO 2069		ANO 2070		ANO 2071		ANO 2072		ANO 2073		ANO 2074		ANO 2075		ANO 2076		ANO 2077		ANO 2078		ANO 2079		ANO 2080		ANO 2081		ANO 2082		ANO 2083		ANO 2084		ANO 2085		ANO 2086		ANO 2087		ANO 2088		ANO 2089		ANO 2090		ANO 2091		ANO 2092		ANO 2093		ANO 2094		ANO 2095		ANO 2096		ANO 2097		ANO 2098		ANO 2099		ANO 2100		ANO 2101		ANO 2102		ANO 2103		ANO 2104		ANO 2105		ANO 2106		ANO 2107		ANO 2108		ANO 2109		ANO 2110		ANO 2111		ANO 2112		ANO 2113		ANO 2114		ANO 2115		ANO 2116		ANO 2117		ANO 2118		ANO 2119		ANO 2120		ANO 2121		ANO 2122		ANO 2123		ANO 2124		ANO 2125		ANO 2126		ANO 2127		ANO 2128		ANO 2129		ANO 2130		ANO 2131		ANO 2132		ANO 2133		ANO 2134		ANO 2135		ANO 2136		ANO 2137		ANO 2138		ANO 2139		ANO 2140		ANO 2141		ANO 2142		ANO 2143		ANO 2144		ANO 2145		ANO 2146		ANO 2147		ANO 2148		ANO 2149		ANO 2150		ANO 2151		ANO 2152		ANO 2153		ANO 2154		ANO 2155		ANO 2156		ANO 2157		ANO 2158		ANO 2159		ANO 2160		ANO 2161		ANO 2162		ANO 2163		ANO 2164		ANO 2165		ANO 2166		ANO 2167		ANO 2168		ANO 2169		ANO 2170		ANO 2171		ANO 2172		ANO 2173		ANO 2174		ANO 2175		ANO 2176		ANO 2177		ANO 2178		ANO 2179		ANO 2180		ANO 2181		ANO 2182		ANO 2183		ANO 2184		ANO 2185		ANO 2186		ANO 2187		ANO 2188		ANO 2189		ANO 2190		ANO 2191		ANO 2192		ANO 2193		ANO 2194		ANO 2195		ANO 2196		ANO 2197		ANO 2198		ANO 2199		ANO 2200		ANO 2201		ANO 2202		ANO 2203		ANO 2204		ANO 2205		ANO 2206		ANO 2207		ANO 2208		ANO 2209		ANO 2210		ANO 2211		ANO 2212		ANO 2213		ANO 2214		ANO 2215		ANO 2216		ANO 2217		ANO 2218		ANO 2219		ANO 2220		ANO 2221		ANO 2222		ANO 2223		ANO 2224		ANO 2225		ANO 2226		ANO 2227		ANO 2228		ANO 2229		ANO 2230		ANO 2231		ANO 2232		ANO 2233		ANO 2234		ANO 2235		ANO 2236		ANO 2237		ANO 2238		ANO 2239		ANO 2240		ANO 2241		ANO 2242		ANO 2243		ANO 2244		ANO 2245		ANO 2246		ANO 2247		ANO 2248		ANO 2249		ANO 2250		ANO 2251		ANO 2252		ANO 2253		ANO 2254		ANO 2255		ANO 2256		ANO 2257		ANO 2258		ANO 2259		ANO 2260		ANO 2261		ANO 2262		ANO 2263		ANO 2264		ANO 2265		ANO 2266		ANO 2267		ANO 2268		ANO 2269		ANO 2270		ANO 2271		ANO 2272		ANO 2273		ANO 2274		ANO 2275		ANO 2276		ANO 2277		ANO 2278		ANO 2279		ANO 2280		ANO 2281		ANO 2282		ANO 2283		ANO 2284		ANO 2285		ANO 2286		ANO 2287		ANO 2288		ANO 2289		ANO 2290		ANO 2291		ANO 2292		ANO 2293		ANO 2294		ANO 2295		ANO 2296		ANO 2297		ANO 2298		ANO 2299		ANO 2300		ANO 2301		ANO 2302		ANO 2303		ANO 2304		ANO 2305		ANO 2306		ANO 2307		ANO 2308		ANO 2309		ANO 2310		ANO 2311		ANO 2312		ANO 2313		ANO 2314		ANO 2315		ANO 2316		ANO 2317		ANO 2318		ANO 2319		ANO 2320		ANO 2321		ANO 2322		ANO 2323		ANO 2324		ANO 2325		ANO 2326		ANO 2327		ANO 2328		ANO 2329		ANO 2330		ANO 2331		ANO 2332		ANO 2333		ANO 2334		ANO 2335		ANO 2336		ANO 2337		ANO 2338		ANO 2339		ANO 2340		ANO 2341		ANO 2342		ANO 2343		ANO 2344		ANO 2345		ANO 2346		ANO 2347		ANO 2348		ANO 2349		ANO 2350		ANO 2351		ANO 2352		ANO 2353		ANO 2354		ANO 2355		ANO 2356		ANO 2357		ANO 2358		ANO 2359		ANO 2360		ANO 2361		ANO 2362		ANO 2363		ANO 2364		ANO 2365		ANO 2366		ANO 2367		ANO 2368		ANO 2369		ANO 2370		ANO 2371		ANO 2372		ANO 2373		ANO 2374		ANO 2375		ANO 2376		ANO 2377		ANO 2378		ANO 2379		ANO 2380		ANO 2381		ANO 2382		ANO 2383		ANO 2384		ANO 2385		ANO 2386		ANO 2387		ANO 2388		ANO 2389		ANO 2390		ANO 2391		ANO 2392		ANO 2393		ANO 2394		ANO 2395		ANO 2396		ANO 2397		ANO 2398		ANO 2399		ANO 2400		ANO 2401		ANO 2402		ANO 2403		ANO 2404		ANO 2405		ANO 2406		ANO 2407		ANO 2408		ANO 2409		ANO 2410		ANO 2411		ANO 2412		ANO 2413		ANO 2414		ANO 2415		ANO 2416		ANO 2417		ANO 2418		ANO 2419		ANO 2420		ANO 2421		ANO 2422		ANO 2423		ANO 2424		ANO 2425		ANO 2426		ANO 2427		ANO 2428		ANO 2429		ANO 2430		ANO 2431		ANO 2432		ANO 2433		ANO 2434		ANO 2435		ANO 2436		ANO 2437		ANO 2438		ANO 2439		ANO 2440		ANO 2441		ANO 2442		ANO 2443		ANO 2444		ANO 2445		ANO 2446		ANO 2447		ANO 2448		ANO 2449		ANO 2450		ANO 2451		ANO 2452		ANO 2453		ANO 2454		ANO 2455		ANO 2456		ANO 2457		ANO 2458		ANO 2459		ANO 2460		ANO 2461		ANO 2462		ANO 2463		ANO 2464		ANO 2465		ANO 2466		ANO 2467		ANO 2468		ANO 2469		ANO 2470		ANO 2471		ANO 2472		ANO 2473		ANO 2474		ANO 2475		ANO 2476		ANO 2477		ANO 2478		ANO 2479		ANO 2480		ANO 2481		ANO 2482		ANO 2483		ANO 2484		ANO 2485		ANO 2486		ANO 2487		ANO 2488		ANO 2489		ANO 2490		ANO 2491		ANO 2492		ANO 2493		ANO 2494		ANO 2495		ANO 2496		ANO 2497		ANO 2498		ANO 2499		ANO 2500		ANO 2501		ANO 2502		ANO 2503		ANO 2504		ANO 2505		ANO 2506		ANO 2507		ANO 2508		ANO 2509		ANO 2510		ANO 2511		ANO 2512		ANO 2513		ANO 2514		ANO 2515		ANO 2516		ANO 2517		ANO 2518		ANO 2519		ANO 2520		ANO 2521		ANO 2522		ANO 2523		ANO 2524		ANO 2525		ANO 2526		ANO 2527		ANO 2528		ANO 2529		ANO 2530		ANO 2531		ANO 2532		ANO 2533		ANO 2534		ANO 2535		ANO 2536		ANO 2537		ANO 2538		ANO 2539		ANO 2540		ANO 2541		ANO 2542		ANO 2543		ANO 2544		ANO 2545		ANO 2546		ANO 2547		ANO 2548		ANO 2549		ANO 2550		ANO 2551		ANO 2552		ANO 2553		ANO 2554		ANO 2555		ANO 2556		ANO 2557		ANO 2558		ANO 2559		ANO 2560		ANO 2561		ANO 2562		ANO 2563		ANO 2564		ANO 2565		ANO 2566		ANO 2567		ANO 2568		ANO 2569		ANO 2570		ANO 2571		ANO 2572		ANO 2573		ANO 2574		ANO 2575		ANO 2576		ANO 2577		ANO 2578		ANO 2579		ANO 2580		ANO 2581		ANO 2582		ANO 2583		ANO 2584		ANO 2585		ANO 2586		ANO 2587		ANO 2588		ANO 2589		ANO 2590		ANO 2591		ANO 2592		ANO 2593		ANO 2594		ANO 2595		ANO 2596		ANO 2597		ANO 2598		ANO 2599		ANO 2600		ANO 2601		ANO 2602		ANO 2603		ANO 2604		ANO 2605		ANO 2606		ANO 2607		ANO 2608		ANO 2609		ANO 2610		ANO 2611		ANO 2612		ANO 2613		ANO 2614		ANO 2615		ANO 2616		ANO 2617		ANO 2618		ANO 2619		ANO 2620		ANO 2621		ANO 2622		ANO 2623		ANO 2624		ANO 2625		ANO 2626		ANO 2627		ANO 2628		ANO 2629		ANO 2630		ANO 2631		ANO 2632		ANO 2633		ANO 2634		ANO 2635		ANO 2636		ANO 2637		ANO 2638		ANO 2639		ANO 2640		ANO 2641		ANO 2642		ANO 2643		ANO 2644		ANO 2645		ANO 2646		ANO 2647		ANO 2648		ANO 2649		ANO 2650		ANO 2651		ANO 2652		ANO 2653		ANO 2654		ANO 2655		ANO 2656		ANO 2657		ANO 2658		ANO 2659		ANO 2660		ANO 2661		ANO 2662		ANO 2663		ANO 2664		ANO 2665		ANO 2666		ANO 2667		ANO 2668		ANO 2669		ANO 2670		ANO 2671		ANO 2672		ANO 2673		ANO 2674		ANO 2675		ANO 2676		ANO 2677		ANO 2678		ANO 2679		ANO 2680		ANO 2681		ANO 2682		ANO 2683		ANO 2684		ANO 2685		ANO 2686		ANO 2687		ANO 2688		ANO 2689		ANO 2690		ANO 2691		ANO 2692		ANO 2693		ANO 2694		ANO 2695		ANO 2696		ANO 2697		ANO 2698		ANO 2699		ANO 2700		ANO 2701		ANO 2702		ANO 2703		ANO 2704		ANO 2705		ANO 2706		ANO 2707		ANO 2708		ANO 2709		ANO 2710		ANO 2711		ANO 2712		ANO 2713		ANO 2714		ANO 2715		ANO 2716		ANO 2717		ANO 2718		ANO 2719		ANO 2720		ANO 2721		ANO 2722		ANO 2723		ANO 2724		ANO 2725		ANO 2726		ANO 2727		ANO 2728		ANO 2729		ANO 2730		ANO 2731		ANO 2732		ANO 2733		ANO 2734		ANO 2735		ANO 2736		ANO 2737		ANO 2738		ANO 2739		ANO 2740		ANO 2741		ANO 2742		ANO 2743		ANO 2744		ANO 2745		ANO 2746		ANO 2747		ANO 2748		ANO 2749		ANO 2750		ANO 2751		ANO 2752		ANO 2753		ANO 2754		ANO 2755		ANO 2756		ANO 2757		ANO 2758		ANO 2759		ANO 2760		ANO 2761		ANO 2762		ANO 2763		ANO 2764		ANO 2765		ANO 2766		ANO 2767		ANO 2768		ANO 2769		ANO 2770		ANO 2771		ANO 2772		ANO 2773		ANO 2774		ANO 2775		ANO 2776		ANO 2777		ANO 2778		ANO 2779		ANO 2780		ANO 2781		ANO 2782		ANO 2783		ANO 2784		ANO 2785		ANO 2786		ANO 2787		ANO 2788		ANO 2789		ANO 2790		ANO 2791		ANO 2792		ANO 2793		ANO 2794		ANO 2795		ANO 2796		ANO 2797		ANO 2798		ANO 2799		ANO 2800		ANO 2801		ANO 2802		ANO 2803		ANO 2804		ANO 2805		ANO 2806		ANO 2807		ANO 2808		ANO 2809		ANO 2810		ANO 2811		ANO 2812		ANO 2813		ANO 2814		ANO 2815		ANO 2816		ANO 2817		ANO 2818		ANO 2819		ANO 2820		ANO 2821		ANO 2822		ANO 2823		ANO 2824		ANO 2825		ANO 2826		ANO 2827		ANO 2828		ANO 2829		ANO 2830		ANO 2831		ANO 2832		ANO 2833		ANO 2834		ANO 2835		ANO 2836		ANO 2837		ANO 2838		ANO 2839		ANO 2840		ANO 2841		ANO 2842		ANO 2843		ANO 2844		ANO 2845		ANO 2846		ANO 2847		ANO 2848		ANO 2849		ANO 2850		ANO 2851		ANO 2852		ANO 2853		ANO 2854		ANO 2855		ANO 2856		ANO 2857		ANO 2858		ANO 2859		ANO 2860		ANO 2861		ANO 2862		ANO 2863		ANO 2864		ANO 2865		ANO 2866		ANO 2867		ANO 2868		ANO 2869		ANO 2870		ANO 2871		ANO 2872		ANO 2873		ANO 2874		ANO 2875		ANO 2876		ANO 2877		ANO 2878		ANO 2879		ANO 2880		ANO 2881		ANO 2882		ANO 2883		ANO 2884		ANO 2885		ANO 2886		ANO 2887		ANO 2888		ANO 2889		ANO 2890		ANO 2891		ANO 2892		ANO 2893		ANO 2894		ANO 2895		ANO 2896		ANO 2897		ANO 2898		ANO 2899		ANO 2900		ANO 2901		ANO 2902	
----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--

[illegible]


[illegible]

Código Validação: A2GZM9QZXT7S8N5G6ZDHFRTS8NA
Verificação: <https://braga.balcaoeletronico.pt/>
Documento assinado eletronicamente na plataforma es.p




Código Validação: 7YGF7QRXTEY3D65W3YPNTE9DJ
Verificação: <https://braga.balcaoeletronico.pt/>
Documento assinado eletronicamente na plataforma esF

Figures

[illegible]

Código Validação: A9237A60R7X530N3G6X07HFR599NA
Verificação: <https://praga.balcadeletronicos.pt/>
Documento assinado eletronicamente na plataforma eS@Publico Gestiona. Página 36 / 40



Page

[illegible]

Código Validação: 79237406RZKXZ8DQWZGNDHREB9NNA
Verificação: <https://rara.balcaspetronica.ro/>
Documento assinado eletronicamente na plataforma ePublico Gestiona Pagina 36 / 40





Page 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Figure 10



Código Validação: **AD6ZM6Q0XXZS0N0Z03HFE59N1A**
Verificação: <https://nrga.balcaeletronico.pt/>
Documento assinado eletronicamente na plataforma esPublico Gestiona | Página 48 / 48



	Valor Contratual				Adicional 1				Acumulado Contratual + Adicional 1			
Mês	Valor Mensal	Valor Acumulado	Valor Mensal (%)	Valor Acumulado (%)	Valor Mensal	Valor Acumulado	Valor Mensal (%)	Valor Acumulado (%)	Valor Mensal	Valor Acumulado	Valor Mensal (%)	Valor Acumulado (%)
dezembro 23	338 606,80 €	338 606,80 €	15,6%	15,6%					338 606,80 €	338 606,80 €	14,0%	14,0%
janeiro 24	47 956,50 €	386 563,30 €	2,2%	17,8%					47 956,50 €	386 563,30 €	2,0%	16,0%
fevereiro 24	58 493,74 €	445 057,04 €	2,7%	20,4%					58 493,74 €	445 057,04 €	2,4%	18,4%
março 24	49 887,09 €	494 944,13 €	2,3%	22,7%					49 887,09 €	494 944,13 €	2,1%	20,5%
abril 24	55 563,14 €	550 507,27 €	2,6%	25,3%					55 563,14 €	550 507,27 €	2,3%	22,8%
maio 24	175 179,70 €	725 686,97 €	8,0%	33,3%					175 179,70 €	725 686,97 €	7,2%	30,0%
junho 24	87 186,58 €	812 873,55 €	4,0%	37,3%					87 186,58 €	812 873,55 €	3,6%	33,6%
julho 24	84 463,17 €	897 336,72 €	3,9%	41,2%					84 463,17 €	897 336,72 €	3,5%	37,1%
agosto 24	69 543,84 €	966 880,56 €	3,2%	44,4%					69 543,84 €	966 880,56 €	2,9%	40,0%
setembro 24	99 329,99 €	1 066 210,55 €	4,6%	49,0%					99 329,99 €	1 066 210,55 €	4,1%	44,1%
outubro 24	50 430,11 €	1 116 640,66 €	2,3%	51,3%					50 430,11 €	1 116 640,66 €	2,1%	46,2%
novembro 24	34 391,01 €	1 151 031,67 €	1,6%	52,9%					34 391,01 €	1 151 031,67 €	1,4%	47,6%
dezembro 24	138 925,05 €	1 289 956,72 €	6,4%	59,3%					138 925,05 €	1 289 956,72 €	5,7%	53,4%
janeiro 25	3 688,08 €	1 293 644,80 €	0,2%	59,4%	215 223,97 €	215 223,97 €	89,7%	89,7%	218 912,05 €	1 508 886,77 €	9,1%	62,4%
fevereiro 25	46 395,70 €	1 340 040,50 €	2,1%	61,9%	24 803,58 €	240 027,55 €	10,3%	100,0%	71 199,28 €	1 580 068,05 €	2,9%	65,4%
março 25	51 438,71 €	1 391 479,21 €	2,4%	63,9%		240 027,55 €		100,0%	51 438,71 €	1 631 506,76 €	2,1%	67,5%
abril 25	140 314,30 €	1 531 793,51 €	6,4%	70,4%		240 027,55 €		100,0%	140 314,30 €	1 771 821,06 €	5,8%	73,3%
maio 25	196 440,02 €	1 728 233,53 €	9,0%	79,4%		240 027,55 €		100,0%	196 440,02 €	1 968 261,08 €	8,1%	81,4%
junho 25	314 304,03 €	2 042 537,56 €	14,4%	93,8%		240 027,55 €		100,0%	314 304,03 €	2 282 565,11 €	13,0%	94,4%
julho 25	134 582,45 €	2 177 120,01 €	6,2%	100,0%		240 027,55 €		100,0%	134 582,45 €	2 417 147,56 €	5,6%	100,0%
		2 177 120,01 €		100,0%		240 027,55 €		100,0%		2 417 147,56 €		100,0%

Contratual:	2 295 133,71 €
Supressões:	-118 013,70 €
Adicional 1:	240 027,55 €
	2 417 147,56 €

Código Validação: A9Z6HMAKXZS0N7QWPHF8P5LA
Verificação: <https://rpaag.balcaoeletronice.at/>
Documento assinado eletronicamente na plataforma eSPublioo Gestiona. Página 48 de 49



RECIBO

REGISTO DE ENTRADA		
LOCAL	NÚMERO DE REGISTO	DATA E HORA
Registo Central	2025-E-RC-4181	10/02/2025 10:40
RESUMO		
Empreitada "Ordenamento e regularização do Rio Torto e Ribeira de Panóias"		
TERCEIRO	N.º DE IDENTIFICAÇÃO	NOME
Requerente/Interessado	500553408	ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.

DOCUMENTOS
NOME DO FICHEIRO: Empreitada "Ordenamento e regularização do Rio Torto e Ribeira de Panóias".pdf
TIPO DE DOCUMENTO: Outros
VALIDADE: Cópia Conforme o Original
CSV: ADG7M2Q7WTSSNZGZDHF3592NA
HASH: f4297e4a7fc1ee2c1780b334b0582b96cf2b565c

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE

